

Inwestycje Gminy Kock w 2021 roku

INWESTYCJE 2021 MIASTO I GMINA KOCK



INWESTYCJE GMINY KOCK W 2021 R.

W 2021 r. na inwestycje wydatkowano kwotę **8.804.336,39 zł**, z czego **3.839.641,42 zł** stanowiły środki ze źródeł zewnętrznych.

POROZUMIENIA Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na zadanie „*Modernizacja drogi powiatowej nr 1221L w miejscowości Talczyn*” - przebudowa mostu na rzece Czarna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1221L (Wola Osowińska - Nowiny) - Tereba - Talczyn - Annopol - do drogi woj. nr 808) przekazano 513.341,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Lubartowskiego (100% wykonania). Ponadto na rzecz powiatu przekazana została dotacja w kwocie 240.750,00 zł na remont drogi powiatowej nr 1221L. Łącznie dało to kwotę **754.091,00 zł**.



ZADANIA WŁASNE

Wydano **8.017.264,39 zł** na poniższe inwestycje.

1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w gminie Kock - w roku 2021 plan wyniósł 4.416.786,00

zł. Przedmiotem zadania jest budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kocku, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody w Górcie i w Białobrzegach. Zakres robót budowlanych obejmuje:

- przebudowę i budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym metodą bezwykopową w ul. B. Joselewicza, M. Stępnia, Sportowej, Przechodniej i Piłsudskiego w Kocku (łączna długość sieci wodociągowej to 2860 m);
- przebudowę przyłączy wodociągowych metodą bezwykopową (łączna długość przyłączy to 2031 m);
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Joselewicza w Kocku do granic aglomeracji o łącznej długości 140 m;
- modernizację SUW w Górcie i Białobrzegach, w tym montaż instalacji fotowoltaicznych, w celu zwiększenia wydajności i jakości dostarczanej wody dla celów bytowych;
- dostawę i montaż ok. 2.000 sztuk wodomierzy ultradźwiękowych z wbudowanym nadajnikiem radiowym;
- wykonanie serwisu internetowego umożliwiającego dokonywania transakcji online (zawieranie umów, odczyty wodomierzy, pobieranie opłat, stan rozliczeń, uwagi, zapytania itp.).

Na dzień 31.12.2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.027.490,56 zł na roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych, wymianą sieci wodociągowej i wymianą wodomierzy na ultradźwiękowe na większości obszaru gminy.

W 2022 r. zostanie dokończona wymiana wodomierzy i nastąpi uruchomienie serwisu internetowego.



Fotowoltaika przy SUW w Białobrzegach




Zestaw wodomierza ultradźwiękowego.

2. Modernizacja systemu sterowania na SUW w Talczyńcu - wydatki wyniosły **36.900,00 zł**

(100% wykonania).

- Przebudowa ciągu pieszego na ul. Ogrodowej w Kocku (od ul. T. Kościuszki) – plan 189.865,00 zł, wykonanie **189.865,43 zł** (100,00%). Zapłacono za projekt i roboty budowlane, długość ciągu – 300 m, nawierzchnia z kostki, podbudowa piaskowo – cementowa oraz z tłucznia; zadanie zrealizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego.

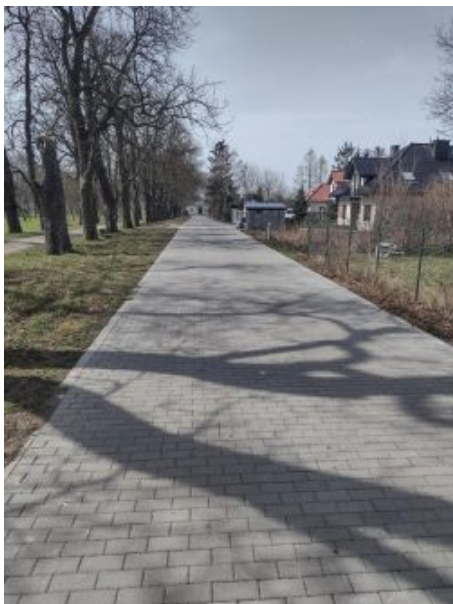

- Przebudowa drogi gminnej nr 103160L – ul. Ogrodowa (od ul. B. Joselewicza) – plan 110.000,00 zł, wykonanie **53.445,44 zł** (48,59%). Wydatki poniesiono na zakup kruszywa i



nawierzchnię asfaltową. Zadanie zostało zakończone

- Przebudowa drogi gminnej nr 112637L w Górcie – plan **659.276,00 zł**, wykonanie **659.275,65 zł**. Długość drogi to 993 m, położona została warstwa bitumiczna. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w całości zakończone.



6. Przebudowa drogi gminnej nr 112627L w Talczyń - plan 536.904,00 zł, wykonanie **536.841,60 zł** (99,99%). Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w całości zakończone.



7. Modernizacja drogi gminnej nr 112640L w Kocku Rolnym - plan 582.488,00 zł, wykonanie **582.487,62 zł** (100,00%). Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w całości zakończone.



8. Utwardzenie działek numer 868/1 i 868/2 w obrębie geodezyjnym Kock Rolny, łączących drogę serwisową z drogą nr 112637L w Górcie - plan 159.648,00 zł, wykonanie **159.647,12 zł**. Długość drogi 480 m, położona została warstwa bitumiczna. Zadanie zostało zakończone.




9. Zakup dokumentacji technicznej drogi nr 103149L - obręb geodezyjny Białobrzegi - Poisdów - plan **21.000,00 zł**, wykonanie 100,00%.
10. Budowa bloku komunalnego - plan 400.000,00 zł, wykonanie **77.458,71 zł** (19,36%). Zapłacono za projekt budowlany i przyłącze gazowe.
11. Modernizacja dachu na budynku komunalnym przy Pl. A. Jabłonowskiej i oficyny przy pałacu - plan **93.000,00 zł**, wykonanie 100%. Zadanie zostało zakończone.



12. Zakup mieszkania w Kocku - plan 35.000,00 zł, wykonanie **31.007,25 zł** (88,59%). Zakupiono lokal 17,25 m² jako mieszkanie socjalne do zasobów gminy.
13. Zakup nieruchomości (działek) - plan 290.000,00 zł, wykonanie **269.023,83 zł** (92,77%).
14. Zakup dwóch serwerów do Urzędu Miejskiego - plan 29.028,00 zł, wykonanie **28.536,00zł** (98,31%). Zadanie zostało zakończone.
15. Budowa ogrodzenia przy OSP w Górcie - plan 14.000,00 zł, wykonanie **13.900,00 zł** (99,29%). Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego.



16. Modernizacja dachu na budynku OSP w Poizdowie – plan 36.000,00 zł, wykonanie **36.000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone.
17. Budowa systemu monitoringu wizyjnego – plan **50.000,00 zł**, wykonanie 100%. Zwiększono ilość kamer, a istniejące wymieniono na bardziej nowoczesne, transmisja obrazu odbywa się z wykorzystaniem łączy światłowodowych.
18. Zakup maszyny do czyszczenia parkietu – plan 23.113,00 zł, wykonanie **22.708,88 zł** (98,25%). Zakup maszyny zrealizowała bezpośrednio jednostka organizacyjna gminy – Szkoła Podstawowa w Kocku.
19. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kock – plan 2.990.800,00zł, wykonanie **1.479.896,76 zł** (49,48%). Głównym celem projektu jest zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, przy respektowaniu zasad i zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego. W ramach projektu wykonane zostaną 124 instalacje fotowoltaiczne, 4 kotły na biomasę i 125 instalacji solarnych. Dzięki ich użytkowaniu przez mieszkańców uzyskany zostanie efekt poprawy w zakresie racjonalnej gospodarki energetycznej. Zadanie finansowane będzie ze środków pomocowych oraz udziału mieszkańców w kosztach inwestycji. Na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane 84 instalacje fotowoltaiczne o mocach 2,48 kWp i 3,1 kWp, wymieniono 4 kotły każdy o mocy 25 kW i zamontowano 125 instalacji solarnych o mocach 5,343 kW i 3,562 kW. Rozliczenie za część instalacji solarnych nastąpi w 2022 r. Ponadto pozostanie do montażu 40 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,42 kWp każda.

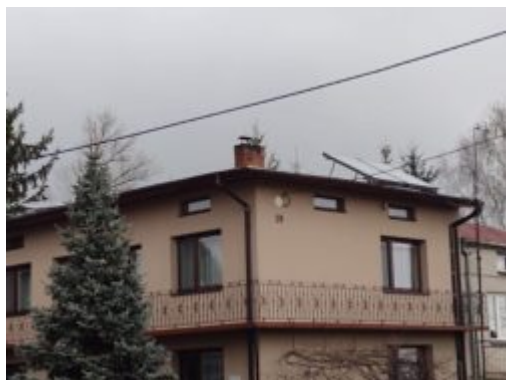

20. Budowa oświetlenia drogi gminnej w Poizdowie – plan 42.000,00 zł, wykonanie **41.249,99 zł** (98,21%). Zadanie realizowano częściowo ze środków funduszu sołeckiego.



21. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Kocku - plan 20.000,00 zł, wydano **20.000,00 zł** na zakup rur. Zadanie sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Nieprzekraczalny termin wykonania zadania - 2024 r.
22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berka Joselewicza od granic aglomeracji - plan **542.430,00 zł**, wykonanie 100%. Przedmiotem zadania była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (oraz jednej tłoczni ścieków), łączącej Kock i Białobrzegi Kolonię. Łączna długość sieci to 495,5 m, ilość planowanych odbiorców - 17. Na dzień 31.12.2021 r. zadanie zostało zakończone.



Tłocznia ścieków przy ul. B. Joselewicza

23. Budowa zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Kocku - plan 150.000,00 zł, wykonanie **45.099,55 zł**. Wydatek poniesiono na dokumentację projektową.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Zostały poniesione na:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocku na dofinansowanie zakupu koparko - ładowarki - **154.731,00 zł** (wykonanie 100,00%);
- dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kocku na dofinansowanie zakupu ciągnika - **63.000,00 zł** (wykonanie 100,00%);
- dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła na niskoemisyjne - **56.000,00 zł** (wykonanie 56,00%), co stanowi 14 wykonanych i rozliczonych umów.

WYDATKI NA ZADANIA DOFINANSOWANE ŚRODKAMI Z BUDŻETU UE

W 2021 r. na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE przeznaczono kwotę 7.978.429,00 zł; na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę **5.073.534,20 zł** (63,59% realizacji). Były to poniższe zadania:

- infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Gminie Kock - wykonanie **3.027.490,56 zł**;
- promocja LGR i Gminy Kock poprzez wydanie publikacji - **23.716,88 zł**;
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kock - **1.479.896,76 zł**;
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berka Joselewicza od granic aglomeracji - **542.430,00 zł**.

Zadania z pkt 1, 3 i 4 zostały opisane wcześniej.

W ramach zadania „*Promocja LGR i Gminy Kock poprzez wydanie publikacji*” zostały wydane dwie publikacje:

- tłumaczenie wydawnictwa Adolfa Bocheńskiego pt. „*Przyczynek do historii stosunków między ziemianami i chłopami w Polsce na podstawie źródeł archiwalnych majątku Kock*” – 1.000 egzemplarzy;
- „*Kalendarium Miasta Kock*” – 750 egzemplarzy.

Publikacje są dystrybuowane bezpłatnie.
